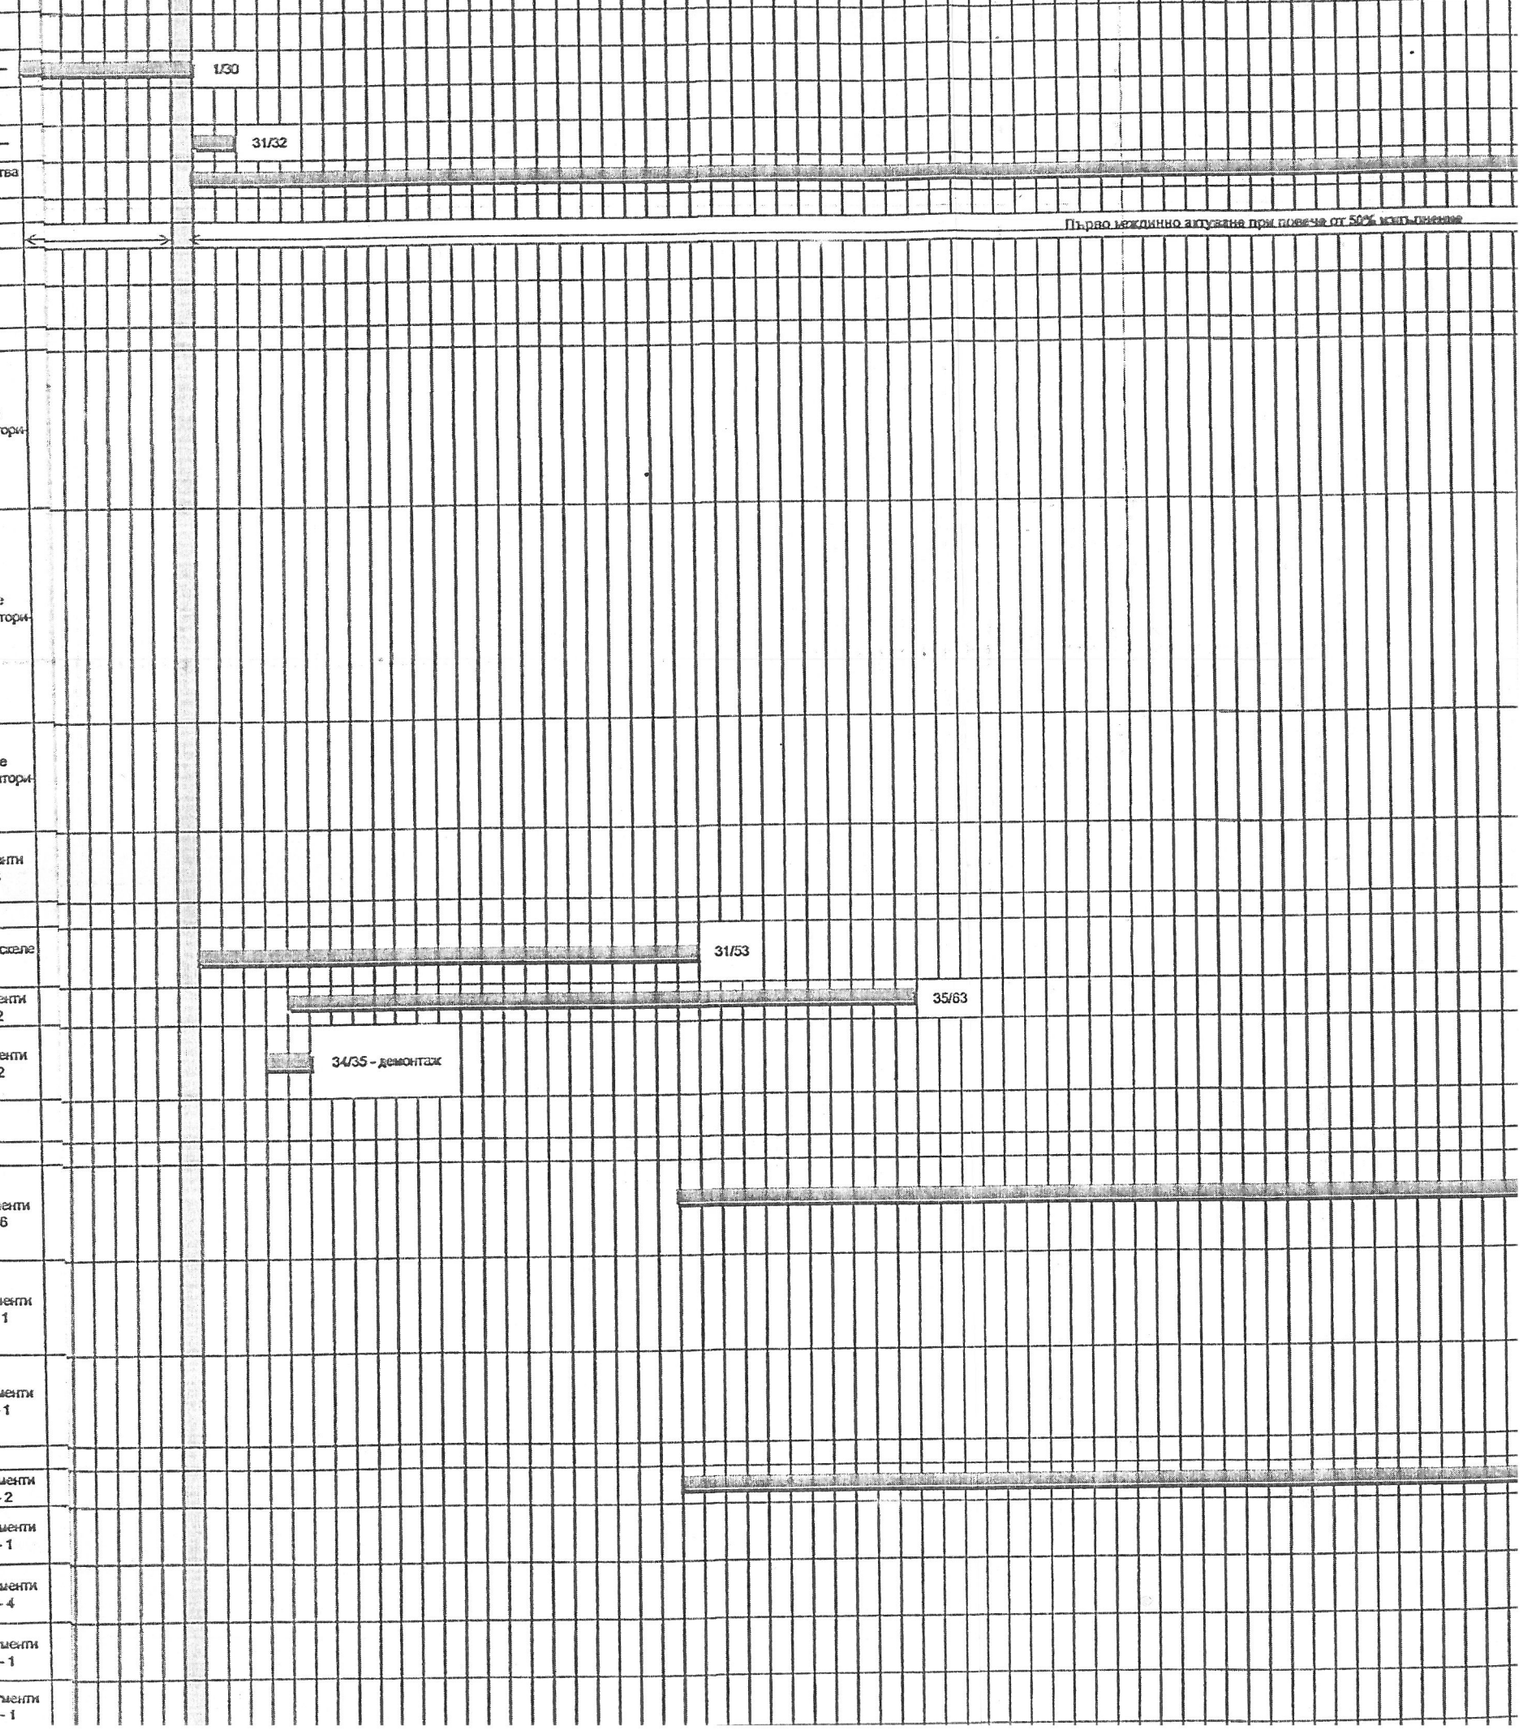№	Наименование на работата	К-во по КС по окрупнени показатели	Труд, човешко часове - обобщено	Труд Обобщено ч.дни	Продължителност на работата Кал.дни - обобщено	Работници, Брой	Вид и брой на работническия състав	Вид и брой на използваната механизация
	РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ							
1	Подготовка и изработка на работен инвестиционен проект	1	2400	300	30	10	Проектанти по съответната част	———
	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР							
	ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	1	64	8	2	4	Техница - 2 Общи работници - 2	———
	ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗДЕЛИЯТА	1	2960	370	185	2	Снабдител - 1 Шофьор - 1	Транспортни средства - 2
	РЕАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР							
	ЕТАПИ НА АКТУВАНЕ							
	Част "Архитектура", "Енергийна ефективност" и "Пожарна безопасност"							
1	Мярка за енергоспестяване №1: Топлинно изолиране на външните стени							
А	Основни СМР							
1	Доставка и монтаж на нова топлоизолационна система тип EPS, с δ= 10 cm и коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK от външната страна на всички фасадни стени и вътрешната част от парапетите на всички остъклени балкони и лоджии (вкл. лепило, дюбели и армиране със стъклофибърна мрежа шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи)	4981,89	7600,00	950	95	10	Квалифицирани работници - 8 Общи работници - 2	Фасадно скеле Кртачи-перфоратори - 8
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип каменна вата с дебелина 100 mm, клас на реакция на огън A1 или A2 и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ=0,040W/mK за изпълнение на канти от топлинна изолация над или около отвори (прозорци или врати) по външните стени на сградата и хоризонтални канти от топлинна изолация по периметъра на сградата (вкл. лепило, дюбели и армиране със стъклофибърна мрежа шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи)	494,06	1248,00	156	39	4	Квалифицирани работници - 2 Общи работници - 2	Фасадно скеле Кртачи-перфоратори - 4
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати с широчина до 30 cm (вкл. лепило, дюбели и армиране със стъклофибърна мрежа шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи)	3774,45	5760,00	720	72	10	Квалифицирани работници - 8 Общи работници - 2	Фасадно скеле Кртачи-перфоратори - 8
4	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени и страници на врати и прозорци, включително грундиране	6608,29	7360,00	920	92	10	Квалифицирани работници - 8 Общи работници - 2	Ръчни инструменти комплект - 8
Б	Съпътстващи СМР							
1	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле	8400,00	2304,00	288	36	8	Квалифицирани работници - 6 Общи работници - 2	Фасадно тръбно скеле - 1 к-кт
2	Демонтаж на съществуващи разнородни топлоизолационни системи по фасадни стени	1474,40	464,00	58	29	2	Общи работници - 2	Ръчни инструменти комплект - 2
3	Демонтаж, изнасяне напред и удължаване стойки за климатици, съобразно дебелината на топлоизолационния слой и обратен монтаж климатици	20,00	192,00	24	6	4	Квалифицирани работници - 2 Общи работници - 2	Ръчни инструменти комплект - 2
2	Мярка за енергоспестяване №2: Подмяна на съществуващата стара дограма							
А	Основни СМР							
1	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно високо емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m²K, ретаномера - по спецификация (по апартаменти и общи части)	777,96	3840,00	480	60	8	Квалифицирани работници - 6 Общи работници - 2	Ръчни инструменти комплект - 6
2	Доставка и монтаж на метална пътна входна врата с топлоизолация за блок и горно остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²K - входни врати	4,00	160,00	20	10	2	Квалифицирани работници - 1 Общи работници - 1	Ръчни инструменти комплект - 1
3	Доставка и монтаж на алуминиеви входни врати, остъклени със стъклопакет с едно високо емисионно външно стъкло и коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K - задни входни врати	11,52	288,00	36	18	2	Квалифицирани работници - 1 Общи работници - 1	Ръчни инструменти комплект - 1
Б	Съпътстващи СМР							
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти и общи части	826,32	1248,00	156	78	2	Общи работници - 2	Ръчни инструменти комплект - 2
2	Доставка и монтаж на пътни метални врати - сервизни помещения на сутерийно ниво	7,20	176,00	22	11	2	Квалифицирани работници - 1 Общи работници - 1	Ръчни инструменти комплект - 1
3	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. цементова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финизен слой) - (по апартаменти и общи части)	2105,95	3936,00	492	82	6	Квалифицирани работници - 4 Общи работници - 2	Ръчни инструменти комплект - 4
4	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 35 см	1220,75	320,00	40	20	2	Квалифицирани работници - 1 Общи работници - 1	Ръчни инструменти комплект - 1
5	Доставка и монтаж на външен PVC подпрозоречен перваз	462,35	128,00	16	8	2	Квалифицирани работници - 1	Ръчни инструменти комплект - 1
